

재건축조합 대의원 교육

PPT · 워크북 겸용 | 인쇄용

시공사 선정 시 건설비 검증 실무

대의원이 시공사 제안 건설비를 스스로 뜯어보고
적정성을 판단하기 위한 5개 챕터 · 5개 실습 · 12개 레드플래그

검증 사례 대우건설 하이엔드 브랜드 ‘써밋(SUMMIT)’ 적용 정비사업

대상 재건축조합 대의원 (건설·회계 비전공 / 실제 의사결정권자)

구성 CHAPTER 0~5 + 부록 A~D · 삽화 17종 · 질의 40문항

작성 기준 2026년 8월

목차

사용법	이 교재를 쓰기 전에 — 필독 3가지	숫자는 자(尺)이지 정답이 아니다
CH 0	오리엔테이션 — 대의원이 지켜야 할 3개의 관문	공사비는 4번 바뀐다 · 공사비 검증제도
CH 1	건설비 총괄 구조	총사업비/총공사비/도급공사비 · 평당 단가 5개 합정
CH 2	건설비 구성요소별 스테디	직접비·간접비·설계감리·특화·금융·에스컬레이션
CH 3	하이엔드 브랜드 검증 시 주의점 — ‘써밋’ 사례	브랜드 프리미엄 3층 분해법
CH 4	검증 실전 도구	6단계 정규화 · 내역 대사 · 질의 40문항
CH 5	레드플래그 시그널	12개 위험신호와 대응 문구
부록 A	용어집	25개 용어 1줄 정의
부록 B	실습 해설	실습 1·2·3·5 정답 및 풀이
부록 C	총회 표결 직전 최종 10문항	찬성표를 던지기 전 자가진단
부록 D	참고자료	출처 링크

이 교재를 쓰기 전에 — 필독 3가지

1. 이 교재의 숫자는 ‘정답’이 아니라 ‘자(尺)’입니다

본문의 모든 단가·요율·비중은 2026년 8월 기준 공개자료와 시장 통례를 정리한 **참고 구간**입니다. 우리 단지의 층수·구조형식·지하층수·대지조건·물가시점에 따라 20~30%는 쉽게 달라집니다. 숫자를 외우지 말고 **“이 항목은 이 범위를 벗어나면 물어 봐야 한다”**는 감각을 가져가십시오.

2. 대의원은 원가를 계산하는 사람이 아니라, 질문하는 사람입니다

대의원이 적산(도면을 보고 자재 물량과 금액을 계산하는 일)을 직접 할 필요는 없습니다. 대의원의 역할은 ① 시공사가 낸 숫자의 **기준을 확정시키고**, ② 기준이 다른 제안을 **같은 기준으로 환산시키고**, ③ 설명이 안 되는 항목을 **회의록에 남기는 것**입니다. 이 세 가지만 해도 조합원 1인당 수천만 원이 지켜집니다.


3. 특정 건설사에 대한 평가 문서가 아닙니다

‘써밋’을 사례로 삼은 것은 하이엔드 브랜드 검증 논리를 설명하기 위함이며, 특정 회사의 제안이 부당하다는 판단을 담고 있지 않습니다. 같은 논리는 자이 시그니처·디에이치·아크로·오티에르 등 모든 하이엔드 브랜드 검증에 동일하게 적용됩니다.

오리엔테이션 — 대의원이 지켜야 할 3개의 관문

0-1. 공사비는 ‘한 번’ 정해지지 않습니다

조합원들이 가장 크게 오해하는 지점입니다. 공사비는 **최소 4번** 바뀝니다. 그리고 **대의원이 개입할 수 있는 힘은 뒤로 갈수록 급격히 약해집니다.**

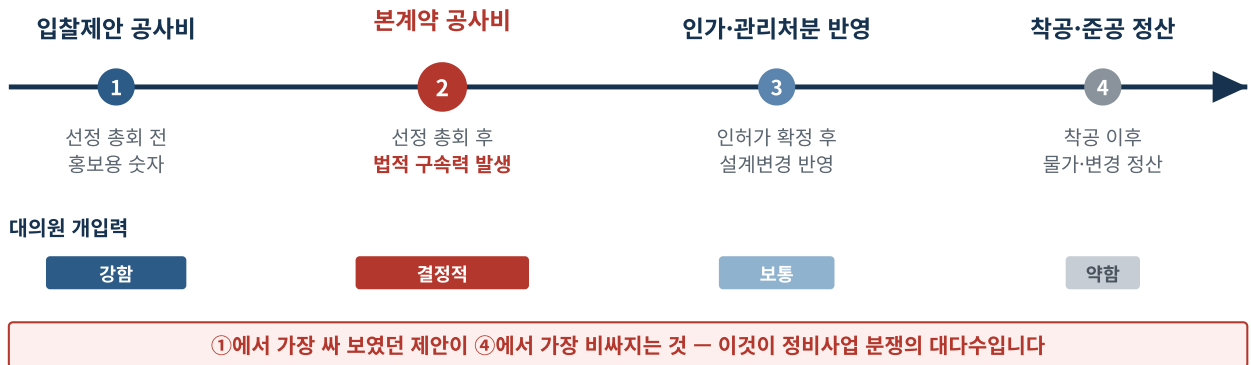

[그림 0-1] 공사비가 확정되는 4단계와 단계별 대의원 개입력

핵심

대의원은 ①(입찰제안)이 아니라 ②(본계약 조문)에서 승부를 봐야 합니다. 입찰제안서의 평당 단가보다 **계약서의 조정 조항**이 10배 중요합니다.

0-2. 제도적 안전판 — 공사비 검증제도

공사비 검증제도

정비사업에서 공사비를 일정 비율 이상 증액할 때, 조합이 검증기관(한국부동산원 등)에 의뢰해 공사비 적정성을 검증받는 제도. 2019년 10월 시행.


의무 검증 대상 (도시 및 주거환경정비법)

#	요건	대의원 활용법
1	토지등소유자 또는 조합원의 20% 이상 이 요청하는 경우	대의원회가 조직할 수 있는 카드. 미리 알고 있어야 씁니다
2	공사비 증액비율이 사업시행계획인가 이전 시공자 선정 시 10% 이상, 인가 이후 선정 시 5% 이상 인 경우	선정 시점에 따라 방어선이 다릅니다
3	이미 검증을 완료한 뒤 다시 3% 이상 증액되는 경우	재검증 요구 근거

대의원이 반드시 알아야 할 한계

- ① 검증은 **증액 국면에서만** 자동으로 작동합니다. **최초 계약 단가 자체의 적정성은 조합이 스스로 지켜야 합니다.**
- ② 검증기관은 계약서상 공사비 관련 사항과 **공사 물량·단가의 적정성, 각종 보험료**를 봅니다. 즉 **내역서가 없으면 검증 자체가 불가능**합니다. → 그래서 5장 레드플래그 1번이 ‘내역 미공개’입니다.

0-3. 이 교재의 학습 지도



각 장 끝에는 **체크리스트**와 **실습**이 있습니다. 실습은 반드시 직접 계산한 뒤 부록 B를 보십시오.

[그림 0-2] 5개 챕터의 학습 흐름

건설비 총괄 구조

학습목표

- ① 총사업비 / 총공사비 / 도급공사비를 **말로 설명**할 수 있다
- ② 평당 공사비 숫자를 보고 “**기준이 뭐냐**”를 **반사적으로 되묻는다**
- ③ 기준이 다른 두 제안을 **같은 총액으로 환산**할 수 있다

1-1. 세 개의 ‘비용’ — 반드시 구분하십시오

■ 총사업비 (Total Project Cost) — 조합이 쓰는 모든 돈 = 100%

총 사업비 100% (조합원 부담금의 모수)

① 총공사비 약 65~78%

② 사업비 약 22~35%

③ 도급공사비 ← 시공사 선정 경쟁의 대상

④ 별도

③ 도급공사비 (총공사비의 85~95%)

- 직접공사비 — 골조 · 마감 · 설비 · 전기 · 조경
- 간접공사비 — 현장관리비 · 각종 보험료 · 안전관리비
- 일반관리비 (본사 배부) + 이윤

▶ 2장에서 이 블록을 6개로 해부합니다

④ 별도공사비

- 철거·석면
- 지장물 이설
- 문화재 조사
- 미술장식품

▶ 분쟁 화약고

② 사업비

- 용역비 — 설계 · 감리 · 정비업체 · 감정평가
- 금융비용 — 사업비/이주비 대여자 · PF
- 제세공과 — 취득세 · 보존등기 · 인입부담금
- 부담금 — 학교용지 · 광역교통 · 재초환
- 조합운영비 · 예비비(1~5%)

시공사가 말하는 “**평당 830만원**”은 ③ 도급공사비입니다.

조합원이 실제 부담하는 것은 **총사업비**이며, 도급공사비는 그 중 약 60~70%에 불과합니다.

도급공사비 평당 830만원 ≒ 총사업비 평당 1,200~1,350만원

[그림 1-1] 총사업비 → 총공사비 → 도급공사비의 계층 구조와 실제 부담금의 관계

용어 정의 (첫 등장 1줄 정의)

용어	1줄 정의
총사업비	조합이 사업 착수부터 청산까지 지출하는 모든 비용의 합계. 조합원 부담금의 모수(母數).
총공사비	건물을 짓는 데 들어가는 비용 전체. 도급공사비 + 별도공사비.
도급공사비	조합이 시공사와 도급계약서로 약정하는 금액. 시공사가 책임지는 범위.
직접공사비	실제 건물에 물리적으로 들어가는 재료비·노무비·장비비.
간접공사비	현장을 운영하기 위해 드는 비용(현장사무소·보험·안전관리 등). 건물에 남지 않음.
별도공사비	도급 범위 밖이라 조합이 따로 부담하는 공사. 여기가 분쟁의 화약고.

대의원이 반드시 붙잡을 포인트

조합원 설명회에서 “평당 830만원”만 듣고 분담금을 계산하면 전부 틀립니다. 반드시 총사업비 추정표와 세대당 분담금 추정치를 함께 요구하십시오.

1-2. 평당(3.3㎡당) 공사비 — 산정 방식과 5개의 함정

$$\text{평당 공사비} = \frac{\text{도급공사비 (원)}}{\text{연면적(㎡)} \div 3.3058}$$

[그림 1-2] 식은 초등학교 수준입니다. 문제는 분자와 분모에 무엇을 넣느냐입니다.


용어

연면적 — 건물 각 층 바닥면적의 합계. 지하층 포함 여부에 따라 값이 크게 달라짐.

3.3058 — 1평 = 3.3058㎡. 편의상 3.3으로 쓰기도 함.

함정 ① 분모 — 지하 포함 연면적이냐, 지상 연면적이냐

이것이 가장 흔하고 가장 큰 착시입니다. 요즘 정비사업은 주차장 지하화로 지하 연면적이 전체의 30~40%를 차지합니다. 지하는 골조 위주라 ㎡당 공사비가 낮지만 면적은 크게 잡히므로, 분모에 지하를 포함하면 평당 단가가 30~40% 낮아 보입니다.

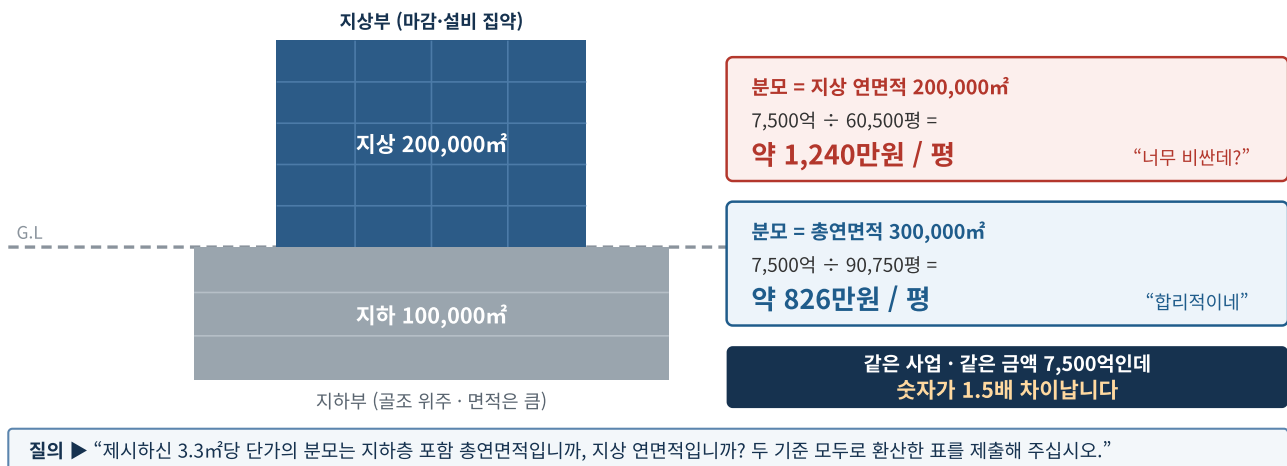

[그림 1-3] 함정 ① — 분모를 바꾸면 같은 금액이 826만원도 되고 1,240만원도 됩니다

함정 ② 부가가치세(VAT) 별도인가, 포함인가

부가가치세(VAT)

재화·용역 공급에 붙는 10% 세금. 주택 공사비에서는 국민주택규모(전용 85㎡) 이하는 면제, 85㎡ 초과는 10% 과세됩니다.

정비사업 입찰제안서는 통상 “VAT 별도”로 표기합니다. 그러나 조합원 부담은 세대별 전용면적 구성비에 따른 **혼합세율**로 결정됩니다. 85㎡ 초과 세대 비중이 40%인 단지라면 실효 VAT는 도급공사비의 **약 4%**입니다.

검증 질의

“VAT 별도 기준 단가와, 우리 단지의 85㎡ 초과 세대 비중을 반영한 실효 VAT 포함 총액을 함께 제시해 주십시오.”

합정 ③ 기준시점 — “언제의 물가로 계산한 금액인가”

입찰제안서 단가에는 반드시 **기준시점(base date)**이 있습니다. 착공까지 통상 2~4년이 걸리고 그 사이 물가상승분이 붙습니다. 건설공사비지수가 연 3%씩 3년 오르면 **약 9.3% 증액** — 7,500억이면 **약 700억**입니다. **기준시점이 다른 두 제안의 단가 비교는 무의미합니다.**

검증 질의

“단가의 물가 기준시점은 언제이며, 착공 시까지 물가변동 조정을 적용하지 않는 기간은 몇 개월입니까?”

합정 ④ 설계변경 여지 — “지금 도면으로 계산한 금액인가”

시공사 선정 시점의 설계는 대부분 **조합이 만든 계획설계(기본안)**입니다. 인허가 과정에서 층수·세대수·주차대수·기부채납이 바뀝니다. 이때 단가를 어떻게 재산정하는지가 계약서에 없으면 **시공사가 부르는 대로** 됩니다.

방식	정의	조합 리스크
총액도급 (Lump Sum)	총액을 확정, 물량 증감 위험을 시공사가 부담	낮음. 단, 설계변경 시 분쟁
내역도급 (단가도급)	항목별 단가를 확정, 물량×단가로 정산	물량 증가 시 그대로 증액
혼합형 (현실)	총액 제시 + “설계변경 시 별도 협의”	★ 가장 위험. 협의가 곧 인상

검증 질의

“본 제안은 총액도급입니까 내역도급입니까? 설계변경 발생 시 단가 재산정 방식(고정단가 적용 / 신규 단가 산출 절차 / 제3자 검증)을 계약 조문 초안으로 제출해 주십시오.”

합정 ⑤ 포함 범위 — 무엇이 도급 안에 있고 무엇이 밖에 있는가

항목	통상 포함	자주 빠지는 항목 (별도 청구 위험)
기존 건물 철거 · 석면해체	△	★ 자주 별도
지장물 이설 (한전 · 통신 · 상하수도)	△	★ 자주 별도
문화재 지표 · 발굴조사	×	★ 거의 별도
흙막이 · 터파기 특수공법 추가분	△	★ 지질조사 결과에 따라 별도
특화설계비 / 브랜드 특화	△	★★ 3장 핵심 쟁점
미술장식품 (건축물 미술작품)	×	별도
인입분담금 (전기 · 가스 · 상수도)	×	사업비
유상옵션 (가전 · 시스템에어컨 등)	×	입주민 부담
감리비	×	사업비

검증 질의

“도급 범위 포함/불포함 항목을 위 형식의 표로 작성해 제안서에 첨부하고, 불포함 항목의 예상금액을 함께 기재해 주십시오.”

평당 단가를 보면 반사적으로 확인할 5가지

①

분 모

총연면적 vs 지상
최대 1.5배 착시

②

VAT

별도 / 포함
85㎡ 초과만 과세

③

기준시점

언제의 물가인가
3년이면 +9%

④

설계변경

총액 / 내역 / 혼합
'협약'는 인상

⑤

포함 범위

철거·지장물·특화
밖에 있으면 추가

이 5개를 확정하기 전까지 “싸다 / 비싸다”는 판단은 성립하지 않습니다

[그림 1-4] 평당 공사비의 5개 합정 — 제안서를 받으면 이 순서로 확인합니다

1-3. 실습 1 — 두 제안, 어느 쪽이 싼가?

【실습 1】 정규화 계산 연습 · 직접 계산한 뒤 부록 B와 대조하십시오

우리 단지 조건 — 지상 연면적 200,000㎡ / 지하 연면적 100,000㎡ / 총연면적 300,000㎡ / 총 1,000세대 / 전용 85㎡ 초과 세대 비중 40% (단순화를 위해 아래에서는 VAT 10% 전액 과세로 계산)

구분	A 건설	B 건설
제시 단가	3.3㎡당 830만원	3.3㎡당 1,180만원
면적 기준	총연면적 (지하 포함)	지상 연면적
VAT	별도	포함

Q1. 조합원 대다수는 어느 쪽이 싸다고 생각하겠습니까?

Q2. 두 제안을 'VAT 별도 · 총액' 기준으로 환산하면 각각 얼마입니까? (계산 과정을 쓰십시오)

Q3. 차액은 세대당 얼마입니까?

1-4. 챕터 1 체크리스트

시공사 제안서를 받으면 이 9개를 가장 먼저 확인하십시오.

☐ 제시 단가의 분모가 총연면적인지 지상 연면적인지 문서로 확인했다

☐ VAT 별도/포함 여부를 확인하고, 85㎡ 초과 비중 반영 실효 VAT를 계산했다

☐ 단가의 물가 기준시점(년·월)이 제안서에 명시되어 있다

☐ 총액도급 / 내역도급 방식이 명시되어 있다

☐ 도급 포함·불포함 항목표를 제출받았다

☐ 불포함 항목의 예상금액까지 제출받았다

☐ 도급공사비뿐 아니라 총사업비 추정표를 제출받았다

☐ 총사업비 기준 조합원 세대당 분담금 추정치를 제출받았다


☐ 위 모든 항목을 시공사별로 동일 양식에 옮겨 적었다

건설비 구성요소별 스터디

학습목표

- ① 도급공사비를 6개 블록으로 나눠 각각의 **정상 범위**를 안다
- ② 각 블록마다 **딱 하나의 결정적 질문**을 던질 수 있다

도급공사비 100%의 해부도 (공동주택 일반)

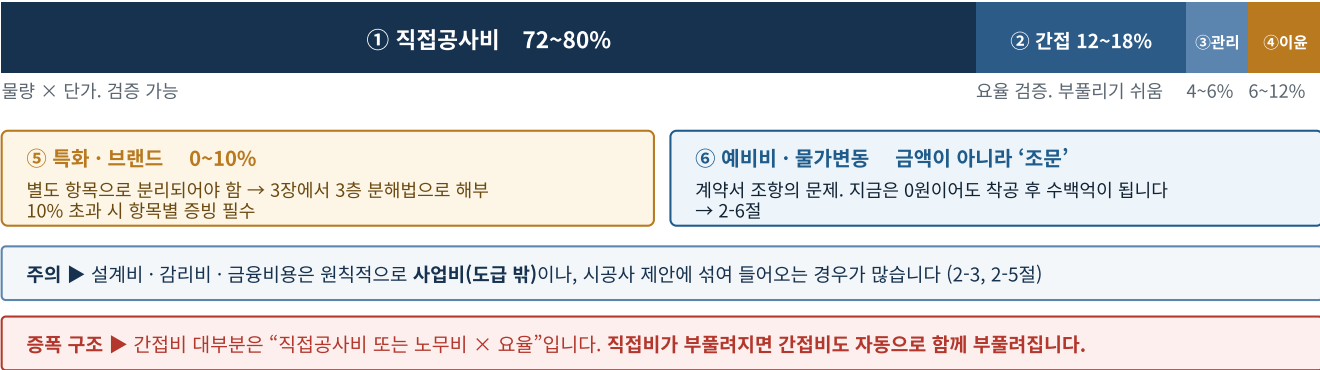


[그림 2-1] 도급공사비 6개 블록과 각 블록의 검증 성격

2-1. 직접공사비 — 골조 / 마감 / 설비 / 전기

직접공사비

실제 건축물을 구성하는 데 직접 투입되는 재료비 + 노무비 + 장비비. 도면과 시방서로 물량을 산출할 수 있으므로 **유일하게 객관 검증이 가능한 영역**입니다.

시장 참고치 — 공종별 비중 (도급공사비 100% 기준)

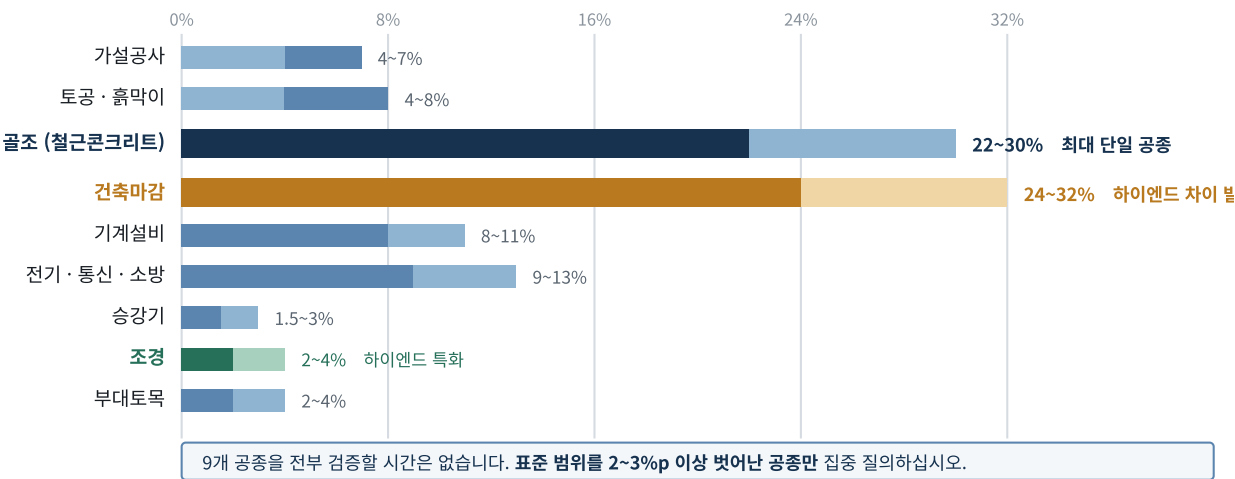

[그림 2-2] 공종별 금액 비중 표준 범위 — 짙은 색이 하한, 옅은 색이 상한

시장 참고치 — 골조 물량 원단위 (내역 대사용 핵심 지표)

아파트 지상부, 연면적 m²당 기준 — 층수·구조형식에 따라 ±20% 변동

항목	m ² 당	평당 환산	정상 범위 이탈 신호
레미콘 (콘크리트)	0.45 ~ 0.60 m ³	1.5 ~ 2.0 m ³	0.7m ³ /m ² 초과 시 근거 요구
철근	55 ~ 80 kg	180 ~ 265 kg	90kg/m ² 초과 시 근거 요구
거푸집	2.8 ~ 3.6 m ²	9 ~ 12 m ²	4.0m ² /m ² 초과 시 근거 요구
철근 / 콘크리트 비	110 ~ 145 kg/m ³		★ 가장 강력한 단일 검증지표

왜 ‘철근 / 콘크리트 비’가 가장 강력한가

콘크리트
1 m³

↔

철근
110 ~ 145 kg

구조설계상 물리적으로 정해지는 관계

110~145 kg/m³ 범위 안
→ 물량이 상식 범위. 다른 항목으로 넘어가십시오

예: 170 kg/m³ 라면
① 정말 초고층·특수구조이거나
② 철근 물량이 부풀려진 것 — 둘 중 하나입니다

둘 중 하나이며, 시공사는 반드시 답해야 합니다 — 답하지 못하면 그 자체가 결론입니다

[그림 2-3] 철근/콘크리트 비 — 대의원이 계산기 하나로 던질 수 있는 가장 날카로운 질문

검증 포인트

- 1. 물량 검증 우선, 단가 검증 나중. 조합원들은 단가(철근 톤당 얼마)에 집착하지만 자재 단가는 시장가라 조작 여지가 작 습니다. 금액 = 물량 × 단가에서 실무상 부풀리기는 물량 쪽에서 일어납니다.
- 2. 표준 범위를 벗어난 공종만 파고드십시오. 전부 보려다 아무것도 못 봅니다.
- 3. 마감 공종은 스펙북(마감재 리스트)과 1:1 대사. 금액만 높고 스펙북이 표준과 같으면 → 3장 레드플래그.
- 4. 단가 출처 요구. 자재 단가는 「물가정보」·「거래가격」·「유통물가」 등 공인 물가지에 근거해야 합니다.

★ 결정적 질문

“공종별 금액과 주요 물량(콘크리트·철근·거푸집)을 연면적으로 나눈 원단위 표를, 귀사가 최근 3년간 수주한 유사 단지 2곳 과 함께 비교 제출해 주십시오.”

2-2. 간접공사비 — 요율 검증의 영역

간접공사비

공사를 수행하기 위해 필요하지만 건축물에 물리적으로 남지 않는 비용. 현장사무소 운영, 관리직원 인건비, 각종 법정보험료, 안전관리비 등.

시장 참고치 — 주요 법정 요율 (2026년 기준)

항목	정의	산정 기준	2026년 참고 요율
간접노무비	현장소장·관리직원 등 직접 시공하지 않는 인력 인건비	직접노무비 대비	8 ~ 13%
산재보험료	산업재해보상보험	노무비 대비	건설업 3.5% (35/1,000)
고용보험료	실업급여·고용안정 재원	노무비 대비	약 1.3 ~ 1.6%
국민연금·건강보험·장기요양	4대보험 중 연금·의료	노무비 대비	합계 약 9 ~ 11%
퇴직공제부금	건설근로자 퇴직공제 (일당 단위 적립)	직접노무비 대비	약 2.3%
산업안전보건관리비	안전시설·보호구·안전인력 등 법정 의무 비용	대상액 (재료비+직접노무비)	일반건축 50억 이상 2.37% (공사종류·규모별 1.86~3.43%)
환경보전비	비산먼지·소음·폐기물 저감	직접공사비 대비	0.3 ~ 0.8%
기타경비	수도광열·통신·복리후생·차량·안전점검	(재료비+노무비) 대비	5 ~ 7%
지급보증수수료 등	하도급대금·건설기계대여 지급보증	계약금액 대비	0.1 ~ 0.3%
일반관리비	본사 운영비 배부액	공사원가 대비	4 ~ 6% (통상 5% 이내)
이윤	시공사 영업이익	공사원가 대비	6 ~ 12%

2026년 변경사항 — 시공사 설명이 사실인 부분

산업안전보건관리비는 2025년 개정으로 요율이 평균 약 19% 인상되었고, 2026년 1월부터 스마트 안전장비 구입·임대비를 총 산안비의 20% 한도 내에서 100% 계상할 수 있습니다. 따라서 “안전관리비가 예전보다 올랐다”는 설명 자체는 사실입니다. 다만 적용 요율표와 대상액 산출근거는 반드시 받아야 합니다.

검증 포인트 — 3대 함정

함정 A. 기준 오해 조달청 제비율은 공공공사 기준. 민간 정비사업은 강제 적용 × “민간이라 다르다” → 맞는 말 그러나 반드시 되물으십시오: “그렇다면 귀사의 요율 근거는 무엇입니까?” → 강제기준 아닌 ‘합리성 잣대’로 사용	함정 B. 대상액 부풀리기 안전관리비 = 대상액 × 요율 정상: 재료비 + 직접노무비 오류: 도급공사비 총액 요율이 정상이어도 대상액을 넓게 잡으면 금액이 커집니다 ▶ 대상액 산출 명세를 요구	함정 C. 중복 계상 · 현장관리비 ↔ 기타경비 · 안전관리비(법정) ↔ 안전시설공사 · 간접비 ↔ 일반관리비 같은 항목이 두 곳에 걸립니다 ▶ 직접비와의 중복 대표표를 요구
---	--	--

요율 자체보다 “무엇의 몇 %인가(대상액)”가 더 중요합니다

[그림 2-4] 간접비 검증의 3대 함정

★ 결정적 질문

“간접공사비 각 항목의 ‘산정 기준(무엇의 몇 %인지)’과 ‘적용 요율’, ‘근거 법령 또는 사내 기준’을 3열 표로 제출해 주십시오.”

— 이 표를 못 내는 시공사는 간접비를 총액으로 얹은 것입니다.

2-3. 설계비 · 감리비

설계비 / 감리비

설계비 — 건축·구조·설비·전기 도면을 작성하는 대가. 정비사업에서는 **조합이 설계자를 총회 의결로 직접 선정**하는 것이 원칙.

감리비 — 시공이 설계도서대로 이루어지는지 감독·확인하는 대가. 주택법상 **사업계획승인권자(지자체)**가 감리자를 지정하며, 비용은 조합(사업주체)이 부담.

항목	총공사비 대비 참고 비율	비고
설계비 (기본 + 실시설계)	1.5 ~ 2.5%	특화설계 · 초고층 · 해외 설계사 참여 시 상승
감리비	0.8 ~ 1.5%	「주택건설공사 감리비 지급기준」 고시 참조
인테리어 · 특화 설계 자문	0.2 ~ 0.6%	하이엔드에서 별도 계상되는 경우 많음

- 설계비·감리비는 원칙적으로 ‘사업비’입니다. 도급공사비에 들어 있으면 이상합니다.** 시공사 제안서에 설계비가 포함되어 있다면 ① 조합이 이미 설계사와 계약한 금액과 중복인지, ② 시공사가 자기 설계사를 쓰겠다는 뜻인지 확인해야 합니다. 후자라면 도시정비법상 조합의 설계자 선정 권한과 충돌할 수 있습니다.
- “설계비 무상 제공” 제안의 실체.** 무상이라면서 단가에 이미 얹혀 있으면 그것은 무상이 아닙니다.
- 감리비를 시공사가 부담한다는 제안은 신중히.** 감리는 시공사를 감독하는 주체입니다. 감리비를 시공사가 내면 **독립성 훼손** 소지가 있습니다. 비용 절감보다 감리 독립성이 조합에 이득입니다.

★ 결정적 질문

“제안서상 설계비·감리비의 부담 주체와 계약 주체를 각각 명시하고, 조합이 기 체결한 설계용역계약과의 관계(승계/병존/해지)를 설명해 주십시오.”

2-4. 특화설계비 · 브랜드 프리미엄

이 항목은 하이엔드 브랜드 검증의 핵심이므로 **3장 전체를 할애**합니다. 여기서는 구조만 정리합니다.

특화설계 / 브랜드 프리미엄

특화설계 — 표준 설계 대비 추가되는 차별화 요소(외관 디자인, 커뮤니티시설 확대, 조경 고급화, 마감재 상향, 층고 상향 등).

브랜드 프리미엄 — 특정 브랜드 적용에 따른 추가 비용. **이 중 얼마가 실제 원가이고 얼마가 명목인지가 쟁점.**

- 하이엔드 브랜드 적용 시 표준 브랜드 대비 도급단가 격차: **3.3㎡당 약 50만 ~ 150만원** 수준으로 관측
- 단, 이 격차는 **브랜드 이름값이 아니라 특화 물량 차이에서 나오는 것이 정상**

- 총공사비 대비 특화·브랜드 항목 비중: 0 ~ 10%. 10% 초과 시 반드시 항목별 증빙 필요

★ 결정적 질문

“특화설계비 총액을 항목별(외관/커뮤니티/조경/마감/충고/기타)로 분해하고, 각 항목의 물량과 단가를 표준 사양과 대비하여 제출해 주십시오.”

2-5. 금융비용 — 보이지 않는 공사비

PF · 사업비 대여 · 이주비 대여

PF(Project Financing) — 사업 자체의 미래 수익을 담보로 자금을 조달하는 방식. 정비사업에서는 시공사의 신용보강(연대보증·책임준공)이 붙는 것이 일반적.

조합 사업비 대여 — 조합 운영비·용역비를 시공사가 대여해 주고, 준공 후 정산 시 이자와 함께 회수하는 것.

이주비 대여 — 조합원 이주를 위한 자금. 기본이주비(은행 대출, 시공사 보증)와 추가이주비(시공사 직접 대여)로 구분.

항목	2026년 참고 수준	비고
조합 사업비 대여금리	연 5 ~ 8%	기준금리(CD 91일물 · 금융채 1년) + 가산 2~4%p
이주비 대여금리	연 4 ~ 7%	기본이주비는 은행 대출금리에 연동
PF 조달금리	연 6 ~ 9%	사업성 · 신용보강 수준에 따라 편차
각종 수수료 (주선 · 보증 · 약정)	조달액의 1 ~ 3%	★ 금리에 숨어 잘 보이지 않음

검증 포인트 — 금융조건은 ‘평당 단가’로 환산해서 비교하십시오

계산 예시 — 1,000세대 / 총연면적 30만㎡ (90,750평) 단지

A 건설 — 이주비 무이자		B 건설 — 이주비 연 5%	
이주비 3,000억 (세대당 3억) · 3년		이주비 3,000억 (세대당 3억) · 3년	
조합 부담 이자 총액	0 원	조합 부담 이자 총액	450 억원
평당 환산	0 원 / 평	평당 환산	약 50 만원 / 평
제시 도급단가	870 만원 / 평	제시 도급단가	830 만원 / 평

금융조건까지 넣은 실질 부담



평당 40만원 비싸 보이던 A가, 금융조건까지 넣으면 평당 10만원 저렴합니다

[그림 2-5] 금융조건을 평당으로 환산하면 순위가 뒤집힙니다 — 제안 비교에서 가장 자주 놓치는 부분

반대 방향의 함정도 있습니다

“무이자 이주비”는 시공사가 자선사업을 하는 것이 아닙니다. 그 이자비용은 이미 도급단가에 선반영되어 있을 가능성이 높습니다.

▶ **질의** — “무이자 이주비 제공에 따른 귀사의 예상 금융비용 부담액과, 그 금액이 도급공사비 단가에 반영된 정도를 밝혀 주십시오.”

그 외 확인 사항

- 대여금리가 **고정인지 변동인지**, 변동이면 기준금리와 가산금리를 분리 표시했는지
- **연체이자율**과 그 발동 조건 (사업 지연 시 폭탄)
- 사업 지연 시 **대여 중단 조건**이 있는지 (있으면 조항이 인질이 됩니다)
- 준공 후 **정산 방식과 시점**

★ 결정적 질문

“이주비·사업비 대여의 금리·기간·수수료를 모두 반영한 ‘**조합 총 금융부담액**’을 산출하고, 이를 3.3㎡당 금액으로 환산하여 제출해 주십시오.”

2-6. 예비비 · 물가상승률(에스컬레이션) 조항

예비비 / 에스컬레이션


예비비 — 예측하지 못한 비용에 대비한 유보액.

에스컬레이션(물가변동에 따른 계약금액 조정) — 계약 후 자재비·노무비 상승분을 공사비에 반영하는 것.

건설공사비지수 — 한국건설기술연구원이 발표하는, 건설자재·노무·장비 가격 변동을 종합한 지수. 통상 소비자물가지수보다 변동폭이 큼.

두 가지를 혼동하지 마십시오. 조합의 **사업비 예비비**(관리처분계획상, 총사업비의 1~5%)와 도급계약상 **공사비 예비비 (Contingency)**는 다릅니다. 도급공사비 안에 예비비가 별도 계상되어 있다면 **어떤 위험에 대한 것인지, 미사용 시 반환 되는지** 반드시 확인하십시오.

에스컬레이션 조항 — 계약서에서 확인할 6개 요소

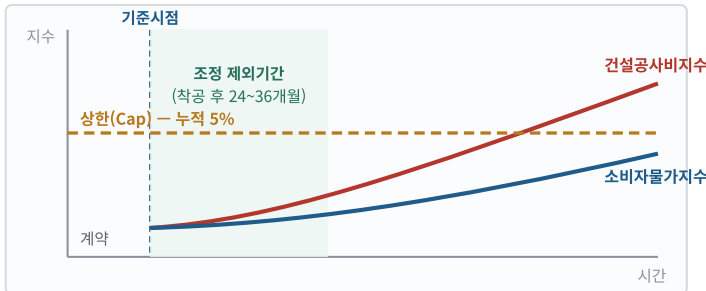

조합에 유리한 방향

- ① **기준시점** — 명시적 날짜, “입찰일” 등 초기 시점
 - ② **적용 지수** — 변동폭 작은 **소비자물가지수**
 - ③ **조정 제외기간** — 착공 후 24~36개월 배제
 - ④ **조정 주기** — 매년보다 일괄 정산 / 긴 주기
 - ⑤ **상한(Cap)** — 총 조정을 상한 (예: 누적 5%)
 - ⑥ **조정 대상** — 이윤·일반관리비는 조정 제외
- ▶ 6개 모두 계약 조문으로 받으십시오

법적 현실 ▶ “물가변동 조정은 하지 않는다”는 조항만 넣으면 안전하다 — 위험한 오해입니다.

건설산업기본법상 경제상황 변동에 따른 계약금액 변경을 상당한 이유 없이 배제하면 그 부분이 무효가 될 수 있습니다.

[그림 2-6] 에스컬레이션 조항의 6개 요소와 지수 선택의 효과

실무적 결론

조합의 방어 전략은 “**조정 배제**”가 아니라 “**합리적 산식 + 명확한 상한 + 긴 배제기간**”입니다. 무조건 배제 조항은 법정에서 깨지면 오히려 **아무 방어막 없는 상태**가 됩니다. 실제로 2023년 이후 폭등한 공사비를 둘러싸고 물가변동 조정 분쟁이 대폭 증가했습니다.

★ 결정적 질문

“물가변동 조정 조항의 기준시점·적용지수·조정 제외기간·조정 주기·상한을 명시한 계약 조문 초안을 제출하고, 착공 지연이 각 1년/2년/3년 발생할 경우의 조정 금액 시뮬레이션을 함께 제출해 주십시오.”

2-7. 실습 2 — 요율 이상 탐지

【실습 2】 시공사가 제출한 간접공사비 내역입니다. 문제가 있는 3개 항목을 찾고 이유를 쓰십시오

#	항목	산정 기준	적용 요율	금액	판정
①	간접노무비	직접노무비	11%	88억	
②	산재보험료	노무비	3.5%	31억	
③	산업안전보건관리비	도급공사비 총액	2.37%	178억	
④	환경보전비	직접공사비	0.5%	30억	
⑤	안전시설공사	총액	—	62억	
⑥	일반관리비	공사원가	9%	540억	
⑦	이윤	공사원가	10%	600억	

Q. 문제 항목 3개와 그 이유를 쓰십시오.

2-8. 챕터 2 체크리스트

- ☐ 공종별 금액 비중표를 받아 표준 범위 이탈 공종을 표시했다
- ☐ 콘크리트·철근·거푸집 원단위와 철근/콘크리트 비를 계산했다
- ☐ 간접비 항목별 산정기준·요율·근거 3열 표를 받았다
- ☐ 안전관리비의 대상액 산출 명세를 받았다
- ☐ 간접비와 직접비의 중복 계상 대사표를 받았다

☐ 설계비·감리비의 부담 주체와 계약 주체를 확인했다

☐ 금융조건을 **평당 금액으로 환산**해 시공사별로 비교했다

☐ 물가변동 조항의 **6개 요소**를 계약 조문 초안으로 받았다

☐ 착공 지연 1/2/3년 **시뮬레이션 금액**을 받았다

☐ 도급 내 예비비의 성격과 미사용 시 처리를 확인했다


하이엔드 브랜드 검증 시 주의점 — ‘써밋(SUMMIT)’ 사례

학습목표

- ① ‘브랜드 프리미엄’을 3개 층위로 분해해 검증 가능/불가능을 가른다
- ② 하이엔드 특화가 실제 스펙 차이로 증빙되는지 판정하는 절차를 익힌다
- ③ 브랜드 적용 확약과 강등 리스크를 계약으로 막는다

3-1. 먼저 사실관계부터 — 시장은 지금 어디에 있나

2026년 정비사업 3.3㎡당 공사비 좌표

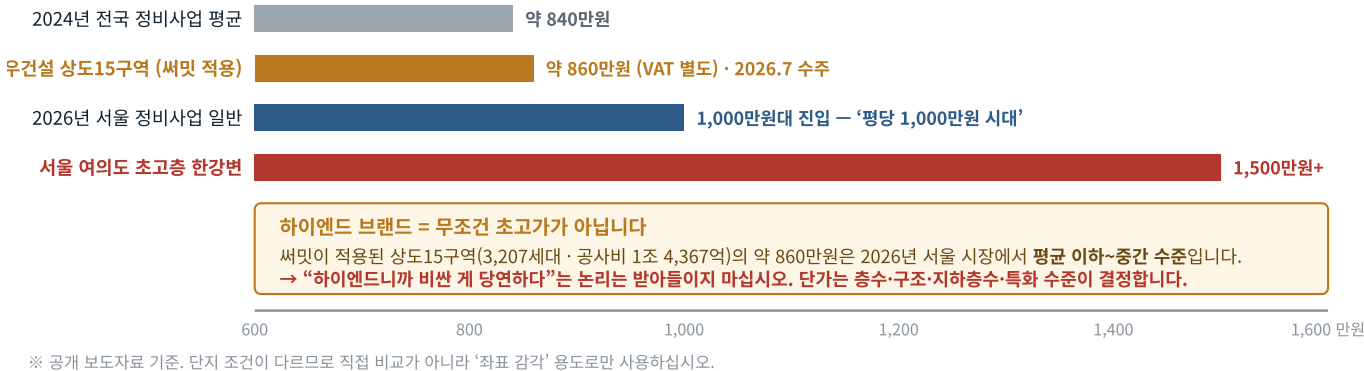

[그림 3-1] 2026년 공사비 좌표에서 ‘써밋’ 사례의 위치

대의원이 여기서 읽어야 할 3가지

#	사실	대의원의 해석
1	써밋 적용 현장의 단가가 시장 평균 수준	브랜드 이름이 곧 단가는 아닙니다. “하이엔드라서 비싸다”는 설명은 근거가 아니라 주장입니다
2	대우건설은 써밋을 한강변 중심에서 서울 주요 지역·지방 거점으로 전략적 확대 적용 방침	써밋 적용 가능성 자체가 협상 영역입니다. “기준 미달”이라는 답에 그냥 물러설 필요가 없고, 반대로 “써밋 주는 대신 공사비 인상”도 검증 대상입니다
3	2026년 현재 여러 사업장에서 “하이엔드 달라 vs 기준 안 된다” 갈등. 하이엔드·랜드마크 설계 채택 후 분담금 급등 반발 사례 보고	브랜드는 공짜가 아니고 분담금으로 돌아옵니다. 대의원은 이 트레이드오프를 조합원에게 정확히 전달할 책임이 있습니다

3-2. 브랜드 프리미엄 3층 분해법 — 이 교재의 핵심 도구

“브랜드 프리미엄”이라는 한 덩어리를 그대로 놓고 논쟁하면 절대 결론이 안 납니다. 반드시 아래 3개 층으로 쪼갠 뒤, 층별로 다른 검증 방법을 쓰십시오.

LAYER 1 하드웨어 물리적으로 남는 것	마감재 등급 ↑ · 층고 ↑ · 외장재 고급화 · 커뮤니티 면적 ↑ · 조경 수목 규격 ↑ · 지하주차장 사양 ↑ ▶ 검증 방법 : 물량 × 단가로 100% 검증 가능 ▶ 판정 : 증빙되면 정당한 원가 . 지불할 가치가 있습니다 → 3-3절에서 항목별 검증 산식 제공
LAYER 2 소프트웨어 서비스 · 운영	컨시어지 · 조식 서비스 · 하우스키핑 · 카셰어링 · 운영 위탁 ▶ 검증 방법 : 도급공사비가 아니라 ‘운영비’ 문제 ▶ 판정 : 준공 후 운영비는 입주민이 매달 부담합니다 도급공사비에 계상돼 있으면 이중부담 소지 — 무상 운영기간과 종료 후 관리비를 반드시 확인
LAYER 3 명 목 이름값	브랜드 사용료 · 로열티 · BI 적용료 · ‘하이엔드 가산’ ▶ 검증 방법 : 검증 불가 — 원가 근거가 존재하지 않습니다 ▶ 판정 : 내역서에 별도 항목으로 존재하면 삭제 요구 대상 → 이 한 줄을 찾아내는 것만으로 수십~수백억이 정리됩니다 같은 논리가 디에이지 · 아크로 · 자이 시그니처 · 오티에르 등 모든 하이엔드 브랜드에 동일하게 적용됩니다

[그림 3-2] 브랜드 프리미엄 3층 분해도 — 층마다 검증 방법과 판정이 다릅니다

각 층별 대응 스크립트 (그대로 읽으십시오)

“ **Layer 1** — 특화 프리미엄 금액을 마감재·층고·외장·커뮤니티·조경 5개 항목으로 분해하고, 각 항목마다 귀사 표준 브랜드 사양과 써밋 사양의 물량·단가 차이를 표로 제출해 주십시오. 그 합계가 제시하신 프리미엄 금액과 일치하는지 확인하겠습니다. ”

“ **Layer 2** — 컨시어지·조식 등 운영 서비스의 ① 무상 운영 기간, ② 무상 기간 종료 후 예상 월 관리비 증가액(세대당), ③ 해당 비용이 도급공사비에 계상되어 있는지 여부를 명시해 주십시오. ”

“ **Layer 3** — 내역서에 브랜드 사용료·로열티·BI 적용료 등 원가 근거 없이 계상된 항목이 있다면 그 금액과 산출 근거를 제시하고, 근거를 제시할 수 없다면 해당 금액을 도급공사비에서 제외해 주십시오. ”


3-3. Layer 1 정밀 검증 — 항목별 판정 기준

(1) 커뮤니티시설

주민공동시설

「주택건설기준 등에 관한 규정」 상 100세대 이상 공동주택이 갖춰야 하는 시설. **법정 최소 면적은 세대당 2.5㎡** 수준.

세대당 커뮤니티 면적 비교



검증 산식 — 대의원이 계산기로 직접 하십시오

커뮤니티 특화 금액 = (제안 세대당면적 - 일반 세대당면적) × 세대수 ÷ 3.3058 × 커뮤니티 평당단가

예) 1,000세대 · 제안 6㎡ · 일반 3.5㎡ · 평당 1,800만원 → (6-3.5) × 1,000 = 2,500㎡ = 756평 × 1,800만원 = 약 136억원 (전체 평당 약 15만원)

시공사가 “커뮤니티 특화로 평당 60만원”이라고 하면 위 계산과 4배 차이납니다 — 그 차이를 설명하게 하십시오.

[그림 3-3] 커뮤니티 특화 검증 — 대의원이 직접 검산할 수 있는 유일한 항목

추가 확인 — 수영장·사우나는 준공 후 운영비가 큼. 관리비 시뮬레이션을 요구하십시오. (Layer 2 문제)

(2) 외관 특화

사양	3.3㎡당 외장 공사비 참고	비고
일반 (도장 + 부분 타일)	30 ~ 60만원	
준하이엔드 (부분 석재/금속)	60 ~ 120만원	
하이엔드 (석재·금속 커튼월 중심)	120 ~ 250만원	커튼월 비율이 결정적


커튼월(Curtain Wall)

건물 하중을 받지 않고 외벽만 담당하는 유리·금속 외피. 고급감이 크나 단가가 높고 유지관리비도 높습니다.

검증 질의

“외장재 종류별 적용 면적(㎡)과 ㎡당 단가를 제출하고, 표준 사양 대비 증분을 산출해 주십시오. 아울러 준공 후 외장 유지관리비(청소·실링 교체 주기·비용)를 함께 제시해 주십시오.”

(3) 층고 상향

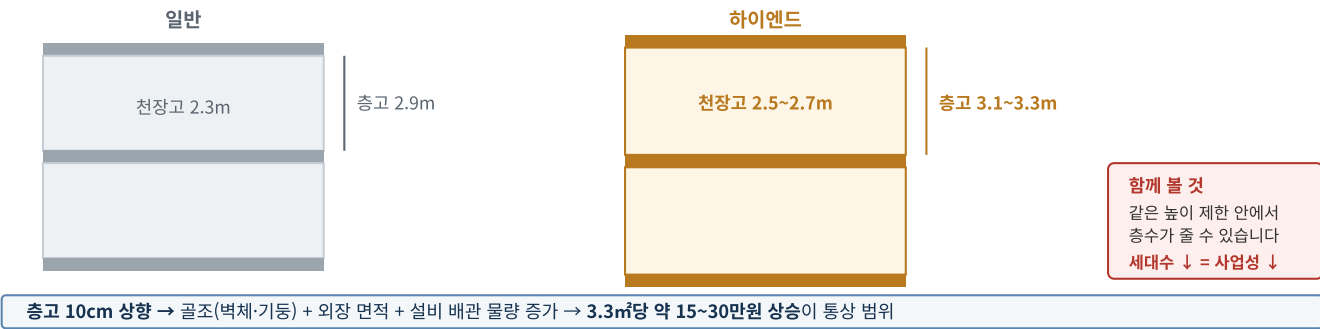

[그림 3-4] 층고 상향의 원가 영향과 숨은 부작용

(4) 마감재 — 스펙북 대사 (가장 실효적인 검증)

대의원이 할 일은 딱 하나: 표준 브랜드 스펙북과 씨밋 스펙북을 나란히 놓고 다른 줄을 세는 것입니다.

부위	표준 사양	제안(써밋) 사양	차이 있음?	단가 차이 근거 제출?
주방가구	국내 A사	이탈리아 / 독일산	☐	☐
수전 · 위생도기	국내산	수입 프리미엄	☐	☐
거실 바닥재	강마루	원목마루 / 대리석	☐	☐
현관 · 욕실 타일	국산 포세린	수입 대형타일	☐	☐
창호	일반 시스템창호	고단열 시스템창호	☐	☐
빌트인 가전	미제공 / 일부	수입 빌트인	☐	☐
홈네트워크	표준	고급형	☐	☐
조명	표준	디자인 조명	☐	☐


판정	결론
차이 항목 8개 중 5개 이상 + 각 항목 단가차 증빙	하드웨어 프리미엄으로 인정
차이 항목이 2~3개인데 프리미엄 금액이 큼	명목 프리미엄 의심 — 감액 협상 대상
“준공 시점에 동등 이상 자재로 대체 가능” 단서	★ 사실상 스펙 확약이 아님 — 5장 RF 7 참조

(5) 조경

구분	도급공사비 대비	특징
일반	2 ~ 3%	기성 수목, 표준 포장
하이엔드	3 ~ 5%	대형 특수목(R30 이상), 수경시설, 조형물

주의 — 대형 수목은 활착 실패(고사) 리스크가 큼. 하자보수 기간과 고사 시 교체 의무를 계약에 넣으십시오.

3-4. ‘무상특화’의 함정 — 가장 흔한 실전 사고

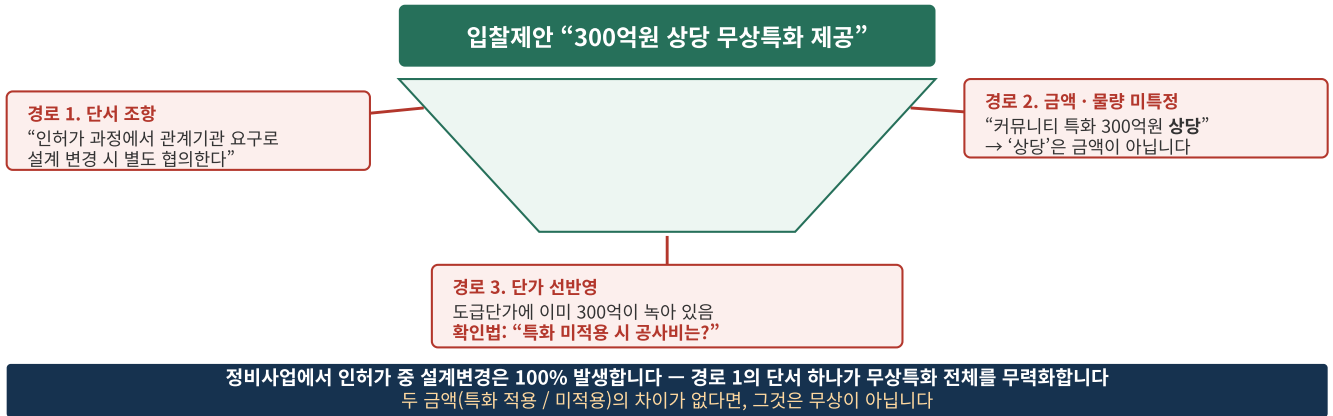


[그림 3-5] 무상특화가 사라지는 3개의 경로

무상특화 계약 방어 조항 5종 (본계약에 반드시 삽입)

- ☐ 무상특화 항목별 명세서(항목 / 사양 / 물량 / 금액)를 계약서 별첨으로 첨부
- ☐ “본 별첨의 사양은 인허가·설계변경 사유로 감액·삭제되지 아니한다” 명시
- ☐ 부득이한 변경 시 동등 이상 사양으로 대체하되 조합의 사전 서면동의 필수
- ☐ 미이행 시 해당 금액을 도급공사비에서 감액한다는 조항
- ☐ 무상특화 미적용(표준 사양) 시의 도급공사비를 계약서에 병기

3-5. 브랜드 확약 — ‘써밋’이라고 썼다고 써밋이 아닙니다



[그림 3-6] 브랜드가 강등되는 전형적 경로

브랜드 확약 조항 체크리스트

- ☐ 계약서 본문에 “단지명 및 적용 브랜드는 ‘써밋(SUMMIT)’으로 한다”가 확정형으로 기재
- ☐ “검토한다 / 노력한다 / 협의한다” 등 노력 의무 표현이 없음
- ☐ 브랜드 적용에 대한 내부 심의 조건부 문구가 없음 (있다면 심의 시점·기준·결과 통지 의무 명시)
- ☐ 미적용 시 위약금(예: 도급공사비의 ○%) 또는 공사비 감액 조항 존재
- ☐ 미적용 시 조합의 계약 해지권 존재

- ☐ 브랜드 미적용 시 감액될 특화 항목 목록이 미리 특정되어 있음
- ☐ 브랜드 확약을 시공사 본사 명의 확약서로 별도 징구 (현장·수주팀 명의 x)

3-6. 실습 3 — 브랜드 프리미엄 판정 연습

【실습 3】 시공사가 “써밋 적용 특화 프리미엄 = 3.3㎡당 120만원 (총연면적 30만㎡ 기준 총 1,089억원)”을 제시했습니다

#	항목	제시 금액	제출된 증빙	Layer 판정
①	외관 특화 (석재 · 커튼월)	380억	외장재별 면적 · 단가표 제출	
②	커뮤니티 확대 (세대당 3.5 → 6㎡)	140억	면적표 제출, 평당단가 미제출	
③	조경 고급화	90억	“고급 수종 적용” 문구만	
④	마감재 상향	210억	스펙북 제출, 8개 항목 중 6개 상향	
⑤	층고 상향 (2.3 → 2.6m)	160억	골조 물량 증가표 제출	
⑥	브랜드 적용료	109억	근거 없음	

Q1. 3층 분해법에 따라 ①~⑥을 Layer 1 / 2 / 3으로 분류하십시오. (위 표 마지막 칸에 기입)

Q2. 즉시 삭제를 요구해야 할 항목은 무엇입니까?

Q3. 추가 증빙을 요구해야 할 항목 2개는 무엇이며, 각각 어떤 자료를 요구합니까?

Q4. 3-3(1)의 커뮤니티 산식으로 ②를 계산하면 얼마입니까? (1,000세대, 커뮤니티 평당 1,800만원)

3-7. 챕터 3 체크리스트

- ☐ 특화 프리미엄을 Layer 1/2/3으로 분해한 표를 받았다
- ☐ Layer 3(명목 프리미엄) 항목의 삭제를 서면으로 요구했다
- ☐ Layer 2(운영 서비스)의 무상 기간 종료 후 관리비 증가액을 받았다

☐ 커뮤니티 특화를 자체 산식으로 검산했다

☐ 스펙북 대사표(표준 vs 써밋)를 작성해 상향 항목 수를 세었다

☐ “동등 이상 자재로 대체 가능” 단서의 삭제 또는 사전동의 조건화를 요구했다

☐ 무상특화 항목별 명세서를 계약 별첨으로 요구했다

☐ 특화 미적용 시 도급공사비를 별도로 제출받았다

☐ 브랜드 확약이 확정형 문구인지 확인했다

☐ 브랜드 미적용 시 위약·감액·해지 조항을 확보했다

검증 실전 도구


학습목표

- ① 기준이 제각각인 제안을 하나의 표로 정규화한다
- ② 내역서를 완독하지 않고도 이상 신호를 잡는다
- ③ 검증위원회가 쓸 질의서를 그대로 복사해 쓴다

4-1. 도구 ① — 타 현장 낙찰 단가 비교표 작성법

정규화(Normalization) 없이 비교하면 반드시 틀립니다. 시공사 A의 830만원과 B의 1,180만원은 단위가 다른 숫자입니다.

6단계 정규화 절차 — 이 계단을 다 올라간 뒤에만 비교합니다

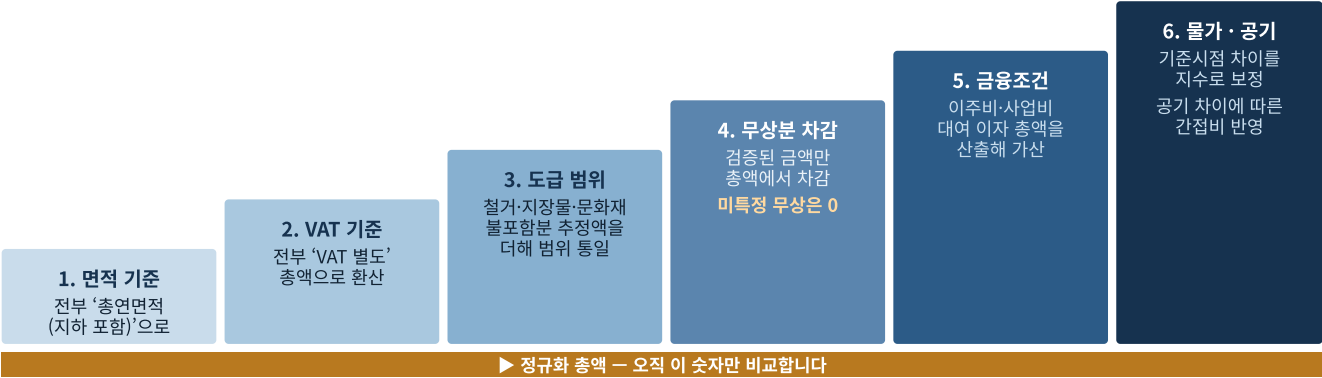

[그림 4-1] 6단계 정규화 — 한 단계라도 건너뛰면 순위가 뒤집힙니다

비교표 양식 (그대로 쓰십시오)

항목	A 건설	B 건설	C 건설	비고
[제시치] 3.3㎡당 단가				홍보용 숫자
면적 기준 (총 / 지상)				
VAT (별도 / 포함)				
물가 기준시점 (년 · 월)				
[1단계] 총연면적 기준 환산 총액				
[2단계] VAT 별도 총액				
[3단계] + 불포함 항목 추정액				철거 / 지장물 / 문화재
[4단계] - 검증된 무상 제공액				미특정 무상은 0 처리
[5단계] + 금융비용 총액				이주비 + 사업비 이자
[6단계] 물가 · 공기 보정				착공 3년 지연 가정
▶ 정규화 총액				★ 이것만 비교
▶ 정규화 3.3㎡당 단가				
세대당 분담금 영향				

외부 비교군(벤치마크) 확보법

- 한국부동산원 정비사업 접수시스템 / 도시정비포털 공개자료
- 인근 조합 상호 정보교류 — 같은 자치구 최근 3년 시공사 선정 조합의 도급계약서 사본
- 언론에 공개된 수주 공사비 — 세대수·연면적이 함께 보도된 건만 사용

비교군은 조건이 맞아야 의미가 있습니다

① 계약 연도 ② 총 세대수 ③ 최고 층수 ④ 지하 층수 — 이 4가지가 유사하지 않으면 단가 비교는 성립하지 않습니다. 특히 35층 초과와 지하 1개층 추가는 단가를 크게 밀어 올립니다.

비교 요소	우리 단지	비교현장 1	비교현장 2	차이 · 보정
계약 연도				1년당 물가보정 필요
총 세대수				
최고 층수				35층 초과 시 급증
지하 층수				1개층당 상승
총연면적				
브랜드 등급				하이엔드 여부
3.3㎡당 단가(정규화)				

4-2. 도구 ② — 물량산출서(내역서) 대사 체크리스트

내역서 / 물량산출서 / 일위대가

내역서 — 공종별로 ‘항목 / 규격 / 단위 / 수량 / 재료비 / 노무비 / 경비 / 합계’를 나열한 문서. 통상 수천~수만 행.
물량산출서 — 도면에서 각 항목의 수량을 어떻게 뽑았는지 계산 과정을 담은 문서.
일위대가(一位代價) — ‘콘크리트 타설 1㎡’ 같은 단위작업 하나에 들어가는 재료·노무·장비를 분해해 단가를 만든 표.

대의원이 수만 행을 다 볼 수는 없습니다 — 4STEP 샘플링 검증으로 충분합니다

STEP 1 · 형식 요건 검사

엑셀 원본(수식 포함)인가 · ‘1식’ 항목 비율 · 집계표와 세부 합계 일치 · 물량산출서 · 일위대가 첨부

10분

STEP 2 · 원단위 계산 ★ 가장 효율적

콘크리트 · 철근 · 거푸집 원단위 / 철근·콘크리트 비 / 공종별 비중 / 간접비율 / 이윤율 — 7개 지표

30분

STEP 3 · 샘플 심층 검증 → 외부 적산 전문가 위탁

금액 상위 10개 공종(총액 80% 커버) + STEP 2 이상 항목 전부 + ‘1식’ 상위 10개 + 특화·브랜드 항목 전부
★ 절대 시공사가 추천한 검증업체를 쓰지 마십시오. 조합이 독자 선정하고 조합이 직접 대금을 지급합니다

STEP 4 · 대사 결과 기록표

공종 / 이상 내용 / 시공사 답변 / 조치 / 감액 — 반드시 대의원회 회의록에 첨부 (법적 분쟁 시 결정적 증거)

STEP 2에서 범위를 벗어난 항목이 3개 이내면 정상적인 사업입니다

[그림 4-2] 내역서 검증 4STEP — 대의원의 시간을 어디에 쓸지 정하는 지도

STEP 1. 형식 요건 검사 (10분)

- ☐ 내역서가 엑셀 원본 파일(수식 포함)로 제출되었는가 (PDF · 이미지만 제출 = 레드플래그)
- ☐ 모든 행에 수량과 단가가 분리되어 있는가 (‘1식’으로 뭉뚱그린 행 개수를 세십시오)
- ☐ ‘1식’ 항목의 금액 합계가 총액의 몇 %인가 → 10% 초과 시 위험
- ☐ 공종별 집계표(요약)와 세부 내역의 합계가 일치하는가
- ☐ 물량산출서가 함께 제출되었는가 (내역서만 있고 산출서가 없으면 검증 불가)

☐ 단가산출서(일위대가)가 첨부되었는가

STEP 2. 원단위 계산 (30분) — 우리 단지 값을 직접 채우십시오

계산 항목	계산식	정상 범위	우리 값	판정
콘크리트 원단위	총 레미콘(㎥) ÷ 연면적(㎡)	0.45 ~ 0.60		
철근 원단위	총 철근(ton)×1,000 ÷ 연면적(㎡)	55 ~ 80 kg		
거푸집 원단위	총 거푸집(㎡) ÷ 연면적(㎡)	2.8 ~ 3.6		
철근 / 콘크리트 비	철근(kg) ÷ 콘크리트(㎥)	110 ~ 145 kg/㎥		
공종별 비중	공종금액 ÷ 도급공사비	[그림 2-2] 참조		
간접비 비율	간접공사비 ÷ 도급공사비	12 ~ 18%		
이윤율	이윤 ÷ 공사원가	6 ~ 12%		

STEP 4. 대사 결과 기록표

#	공종 / 항목	이상 내용	시공사 답변	조치	감액(억)
1					
2					
3					
4					

4-3. 도구 ③ — 조합 검증위원회 질의 항목 40문항

사용법

이 페이지를 그대로 출력해 시공사 설명회에 들고 들어가십시오. 한 사람이 다 물을 필요 없습니다. 대의원 5명이 A~E를 나눠 맡으십시오.

[A] 총괄 구조 — 8문항

#	질의 내용	답변 확보
1	제시하신 3.3㎡당 단가의 분모는 총연면적입니까, 지상 연면적입니까? 두 기준 모두로 환산해 주십시오.	☐
2	VAT 별도입니까 포함입니까? 우리 단지 85㎡ 초과 세대 비중을 반영한 실효 VAT 포함 총액은 얼마입니까?	☐
3	단가의 물가 기준시점(년·월)은 언제입니까?	☐
4	총액도급입니까, 내역도급입니까?	☐
5	도급 포함 항목과 불포함 항목을 표로 제시하고, 불포함 항목의 예상금액을 기재해 주십시오.	☐
6	도급공사비 외에 조합이 부담해야 할 총사업비 항목과 그 추정액을 제시해 주십시오.	☐
7	본 제안 기준 조합원 세대당 예상 분담금은 얼마입니까? 산출 근거를 제시해 주십시오.	☐
8	위 분담금이 20% 증가하는 시나리오와 그 발생 조건은 무엇입니까?	☐

[B] 직접공사비 — 8문항

#	질의 내용	답변 확보
9	공종별 금액과 도급공사비 대비 비중을 표로 제출해 주십시오.	☐
10	콘크리트·철근·거푸집의 총 물량과 연면적 대비 원단위를 제출해 주십시오.	☐
11	철근/콘크리트 비(kg/㎡)는 얼마이며, 그 값의 구조적 근거는 무엇입니까?	☐
12	주요 자재 30개 항목의 적용단가와 공인 물가지 게재단가 대비표를 제출해 주십시오.	☐
13	최근 3년간 귀사가 수주한 유사 규모 단지 2곳의 공종별 원단위와 비교해 주십시오.	☐
14	물량산출서와 일위대가표를 엑셀 원본(수식 포함)으로 제출해 주십시오.	☐
15	내역서상 '1식'으로 계상된 항목의 총 금액과 도급공사비 대비 비율은 얼마입니까?	☐
16	골조 공법(RC / PC / 기타)과 그 선택이 공사비·공기에 미치는 영향을 설명해 주십시오.	☐

[C] 간접비·요율 — 6문항

#	질의 내용	답변 확보
17	간접공사비 각 항목의 산정기준·적용요율·근거를 3열 표로 제출해 주십시오.	☐
18	산업안전보건관리비의 대상액(재료비 / 직접노무비) 산출 명세를 제출해 주십시오.	☐
19	간접공사비와 직접공사비 간 중복 계상이 없음을 확인한 대사표를 제출해 주십시오.	☐
20	일반관리비율과 이윤율은 각각 몇 %이며, 귀사의 타 정비사업 현장과 비교해 어떤 수준입니까?	☐
21	현장 간접비는 공사기간에 비례합니다. 공기가 6개월 연장될 경우 증가액은 얼마입니까?	☐
22	공기 연장의 귀책이 조합 / 시공사 / 불가항력인 경우 각각 비용 부담 주체는 누구입니까?	☐

[D] 하이엔드 · 특화 — 8문항

#	질의 내용	답변 확보
23	‘써밋’ 적용이 계약서에 확정형으로 기재되니까? 내부 심의 조건부입니까?	☐
24	브랜드 미적용 시 위약금 · 감액 · 해지 조항을 제시해 주십시오.	☐
25	특화 프리미엄 총액을 외관 / 커뮤니티 / 조경 / 마감 / 층고 / 기타로 분해해 주십시오.	☐
26	각 특화 항목의 표준 사양 대비 물량 · 단가 차이를 표로 제출해 주십시오.	☐
27	내역서에 브랜드 사용료 · 로열티 성격의 항목이 있습니까? 있다면 산출 근거는 무엇입니까?	☐
28	표준 사양(특화 미적용) 시 도급공사비는 얼마입니까?	☐
29	무상특화 항목별 명세서(항목 / 사양 / 물량 / 금액)를 계약 별첨으로 제출할 수 있습니까?	☐
30	컨시어지 · 조식 등 운영 서비스의 무상 기간과, 종료 후 세대당 월 관리비 증가 추정액은 얼마입니까?	☐

[E] 금융 · 계약조항 — 10문항

#	질의 내용	답변 확보
31	이주비 · 사업비 대여의 금리 · 기간 · 수수료를 모두 반영한 조합 총 금융부담액은 얼마입니까?	☐
32	그 금액을 3.3㎡당으로 환산하면 얼마입니까?	☐
33	대여금리는 고정입니까 변동입니까? 변동이면 기준금리와 가산금리를 분리 제시해 주십시오.	☐
34	연체이자율과 그 발동 조건은 무엇입니까?	☐
35	사업 지연 시 대여 중단 조건이 있습니까?	☐
36	물가변동 조정의 기준시점 · 적용지수 · 조정 제외기간 · 조정 주기 · 상한을 명시해 주십시오.	☐
37	착공이 1년 / 2년 / 3년 지연될 경우 조정 금액 시뮬레이션을 제출해 주십시오.	☐
38	설계변경 시 단가 재산정 방식(고정단가 적용 여부 · 신규단가 산출 절차 · 제3자 검증)을 조문으로 제시해 주십시오.	☐
39	공사비 증액이 필요할 때 조합의 사전 서면동의 및 총회 의결을 거치도록 하는 조항을 넣을 수 있습니까?	☐
40	도급공사비 증액 시 검증기관의 공사비 검증을 조합 요청만으로 받도록 하는 조항에 동의하십니까?	☐

4-4. 실습 4 — 우리 대의원회 역할 분담표

【실습 4】 아래 표를 채우고, 다음 시공사 설명회 전까지 각자 담당 문항을 숙지하십시오

담당	대의원 성명	질의 범위	사전학습	제출받을 자료
A 총괄구조		1~8번	1장	포함/불포함 항목표, 총사업비 추정표
B 직접공사비		9~16번	2-1절	원단위표, 내역서 엑셀 원본
C 간접비		17~22번	2-2절	요율 3열표, 대상액 산출명세
D 하이엔드		23~30번	3장	스펙북, 특화 분해표, 브랜드 확약서
E 금융·계약		31~40번	2-5, 2-6절	계약 조문 초안, 금융부담 환산표

4-5. 챕터 4 체크리스트

- ☐ 시공사별 제안을 6단계 정규화 표에 옮겼다
- ☐ 정규화 총액 기준으로만 순위를 매겼다
- ☐ 유사 조건 비교현장 2곳 이상의 단가를 확보했다
- ☐ 비교현장의 연도·층수·지하층수·세대수 적합성을 확인했다
- ☐ 내역서를 엑셀 원본(수식 포함)으로 받았다
- ☐ '1식' 항목 비율을 계산했다 (10% 초과 여부)
- ☐ 원단위 7개 지표를 검산했다
- ☐ 조합이 독자 선정한 적산 전문가에게 샘플 검증을 위탁했다
- ☐ 40개 질의를 대의원 5명에게 분담했다
- ☐ 질의와 답변을 회의록에 기록했다

레드플래그 시그널

학습목표

- ① 위험 신호를 즉시 식별하고, 그 자리에서 쓸 대응 문구를 갖는다 ② 위험을 회의록에 남기는 습관을 만든다

12개 레드플래그 한눈에 보기

		■ 치명 — 계약 보류 + 총회 안전화	■ 경고 — 서면 보완 + 회의록 기록
RF 1 내역 미공개 총액만 제시, 공종별 내역 × → 공사비 검증 자체가 불가능 “영업비밀” “본계약 후 제출”	RF 2 설계변경 불명확 “상호 협의하여 정한다” → 착공 후엔 협상력이 없습니다 설계변경은 예외가 아닌 기본값	RF 3 특화비 뭉뚱그림 “특화설계 포함 평당 ○○만원” → 검증·감액·강등대응 모두 불가 ‘상당’ 표현도 동일	RF 4 물가조항 일방적 상승만 반영, 하락 감액 × → 상한·양방향 조정 요구 배제 조항은 무효 위험
RF 5 ‘1식’ 남발 1식·일식·LS 표기 → 총액의 10% 초과 시 위험 수량·단가 미분리 = 검증 불가	RF 6 무상에 단서 “인허가 변경 시 별도 협의” → 무상특화 전체가 무력화 방어 조항 5종으로 대응	RF 7 “동등 이상 대체” 누가 ‘동등’을 판정하는가? → 사실상 시공사가 판정합니다 사전 서면동의 요건화	RF 8 브랜드 ‘노력 의무’ “적극 검토 / 노력한다” → 확정형 + 위약 조항 필요 본사 명의 확약서 징구
RF 9 금융조건 조건부 “시장 상황에 따라 변동” → 확정형 + 미이행 시 해지권 연체이자율 15% ↑ 주의	RF 10 비교 불가 형태 기준이 시공사마다 제각각 → 조합의 준비 부족 문제 입찰지침서에 양식 첨부	RF 11 검증업체 추천 “신뢰할 업체를 소개하겠다” → 누가 돈을 내느냐가 편을 정함 조합 독자 선정·조합이 지급	RF 12 시간 압박 “이번 총회에서 결정 안 하면...” → 검증을 막는 가장 값싼 수단 21일 검토기간을 요구

[그림 5-1] 12개 레드플래그 — 붉은색 3개 중 하나라도 해소되지 않으면 총회 상정에 반대하십시오

RF 1 치명 총액 공사비만 제시하고 항목별 내역 미공개

증상

- “평당 ○○○만원, 총 ○조 ○천억” 숫자만 있고 공종별 내역이 없음
- “영업비밀”, “본계약 시 제출”, “선정 후 협의” 등의 사유로 거부
- PDF 요약본만 제공, 엑셀 원본 거부

왜 치명적인가

1. 공사비 검증제도 자체가 무력화됩니다. 검증기관은 물량·단가의 적정성을 봅니다. 내역이 없으면 검증할 대상이 없습니다.
2. 향후 증액 시 비교 기준선(baseline)이 존재하지 않아 증액이 정당한지 판단할 수 없습니다.
3. 설계변경 정산 시 적용할 단가가 없어 시공사가 새로 만드는 단가를 받아들일 수밖에 없습니다.

“공사비 내역서와 물량산출서를 엑셀 원본으로 제출하지 않으시면, 본 제안은 도시정비법상 공사비 검증이 불가능한 제안으로 판단됩니다. 대의원회는 내역 미제출을 사유로 본 안건의 총회 상정 보류를 요청합니다.”

보완책 — 영업비밀 우려가 실제로 있다면

- 검증기관 · 조합 선임 전문가에게만 열람 제공 + **비밀유지약정(NDA)** 체결
- 조합 사무실 내 **열람 전용 제공**(반출 금지)
- 단, “**공종별 집계표는 조합원에게 공개**”가 최소선입니다. 이것마저 거부하면 치명 등급 유지.

RF 2 치명 설계변경 시 단가 재산정 조항 불명확

이 표현이 보이면 즉시 표시하십시오

증상 문구	실제 의미
“설계변경 시 상호 협의하여 정한다”	조합에 협상력이 없는 시점(착공 후)에 협의한다는 뜻
“변경된 부분은 별도 산정한다”	누가, 어떤 기준으로 산정하는지 없음
“시공사가 제시하는 단가를 기준으로 한다”	사실상 백지위임
“물가 및 시장 상황을 고려하여 조정한다”	조정 방향이 한쪽뿐

계약에 반드시 들어가야 할 4단 구조

- ① 기존 내역서에 있는 항목 → **계약 단가 그대로 적용** (재협상 없음)
- ② 없는 항목 → **공인 물가지 게재단가** → 없으면 **3사 견적 평균**
- ③ 위로 산정 불가 시 → 조합·시공사 각 1인 + 합의 선정 **제3 전문가의 산정**에 따름
- ④ 모든 설계변경 증액은 **조합 사전 서면동의** + 일정 금액 초과 시 **총회 의결**

“‘협의’는 산정 기준이 아닙니다. 설계변경 단가 적용 순서를 ① 기존 계약단가 ② 공인 물가지 ③ 3사 견적 ④ 제3자 산정의 4단계로 계약 조문에 명기해 주십시오.”

RF 3 치명 특화설계비를 총공사비에 뭉뚱그려 포함

왜 치명적인가

1. **검증 불가** — 특화 금액이 분리되지 않으면 3장의 3층 분해법을 적용할 수 없습니다. 명목 프리미엄이 그대로 숨습니다.
2. **감액 협상 불가** — 조합이 “이 특화는 빼겠다”고 결정해도 얼마를 빼야 하는지 근거가 없습니다.
3. **브랜드 강등 시 대응 불가** — 써밋이 아닌 일반 브랜드로 바뀌어도 감액할 금액을 특정할 수 없습니다.

“특화설계비를 도급공사비 내 별도 항목으로 분리 계상하고, 항목별 물량·단가를 제출해 주십시오. 아울러 특화 미적용(표준 사양) 시의 도급공사비를 병기해 주십시오.”

RF 4~9 경고 요약 대응표

RF	증상	왜 위험한가	대응
4 물가 조항	상승 시 증액하되 하락 시 감액 조항 없음 · 건설공사비지수만 사용하고 상한 없음 · 조정 제 외기간 6개월 이내 · 이윤/일반 관리비까지 조정 대상	착공 지연 3년이면 수백억 증액. 지 수 선택 하나로 금액이 갈림	2-6절 6개 요소 조문화. 특히 상한(Cap) 과 양방향 조정 요구. 단, “조정 배제” 조항만 넣는 것은 건산법상 무효 위 험이 있어 실효적 방어가 아닙니다
5 ‘1식’ 남발	‘1식 · 일식 · LS’ 표기 항목의 금액 합계가 총액의 10% 초과	수량과 단가가 분리되지 않아 검증할 방법이 원천적으로 없음	“‘1식’ 계상 항목 중 금액 상위 10개에 대해 수량 · 규 격 · 단가로 분해한 세부 내역을 제출해 주십시오.”
6 무상 단서	“인허가 과정에서 변경될 경우 별도 협의” · “관계기관 요구 시 조정될 수 있다”	설계변경은 100% 발생 → 무상특화 전체 무력화	3-4절 방어 조항 5종. 단서 삭제가 어렵다면 최소한 “ 조합 사전 서면동의 없이는 감액·삭제 불가 ”로 전 환
7 동등 이상	“시공 시점의 수급 상황에 따 라 동등 이상 자재로 대체할 수 있다”	‘동등 이상’을 누가 판정하는지 없으 면 사실상 시공사가 판정 → 스펙 확 약이 확약이 아니게 됨	① 조합 사전 서면동의 ② 대체 자재 단가가 원 사양 이상임을 증빙 ③ 단가 하락 시 차액 감액 — 3개 요 건 명기
8 노력 의무	“적극 검토한다 / 협의한다 / 노력한다 / 본사 심의를 거쳐 결정한다”	브랜드 적용이 건설사 내부 심의사항 이라 일방적으로 바뀔 수 있음	3-5절 확약 체크리스트 전 항목. 특히 본사 명의 확 약서와 미적용 시 감액 항목 사전 특정
9 금융 조건 부	“시장 상황에 따라 금리 변동” · “금융기관 심사 결과에 따름” · “무이자 ○년 (이후 미기재)” · 연체이자율 연 15% 이상	확정되지 않은 금융조건은 제안이 아 니라 희망사항	2-5절 결정적 질문 + “ 금융조건 미이행 시 조합의 계 약 해지권 ” 조항 요구

RF 10~12 주의 조합 스스로 막을 수 있는 것들

RF	증상	대응
10 비교 불가	시공사마다 면적 기준 · VAT · 범위가 제각각이고, 조합이 통일 양식을 제 시하지 않음	조합이 먼저 제안서 양식(4-1절 비교표)을 확정해 입찰지침서에 첨부. 이것은 시공사 문제가 아니라 조합의 준비 부족입니다 — 대의원회가 사전에 조치할 수 있습니다
11 검증 업체 추천	“저희가 신뢰할 만한 검증업체를 소 개해 드리겠습니다”	검증업체는 조합이 독자 선정 + 조합이 직접 대금 지급. 예외 없습니다. 비용을 시공사 가 부담하겠다는 제안도 거절하십시오 — 누가 돈을 내느냐가 누구 편이냐를 결정합니 다
12 시간 압박	“이번 총회에서 결정하지 않으면 조 건이 불리해집니다” · “타 조합은 이 미 결정했습니다” · 자료를 총회 3일 전에 제공	“대의원회는 자료 제공일로부터 최소 21일의 검토기간 을 요구합니다. 검토기간이 확보 되지 않은 안건은 총회 상정에 반대합니다.” 진짜 좋은 조건은 3주를 기다려도 사라지지 않습니다.

5-1. 실습 5 — 레드플래그 스캔 훈련

【실습 5】 실제 제안서에서 자주 보이는 문장들입니다. RF 번호와 등급을 적으십시오

#	제안서 문구	RF 번호	등급
1	“특화설계 포함 3.3㎡당 950만원(VAT 별도)”		
2	“설계변경으로 인한 공사비는 상호 협의하여 정한다”		
3	“커뮤니티 특화 250억원 상당을 무상 제공하며, 인허가 과정에서 변경 시 별도 협의한다”		
4	“당사 하이엔드 브랜드 적용을 적극 검토하겠습니다”		
5	“마감재는 제시 사양 또는 동등 이상으로 시공한다”		
6	“내역서는 영업비밀에 해당하여 본계약 체결 후 제공 가능합니다”		
7	“이주비 무이자(3년), 이후 조건은 추후 협의”		
8	“차기 총회에서 결정하지 않으면 제시 조건은 철회됩니다”		

Q. 이 제안에 치명(●) 등급이 몇 개 포함되어 있습니까? 총회 상정에 찬성하시겠습니까?

5-2. 챕터 5 체크리스트 — 총회 상정 전 최종 관문

아래 12개 중 ‘치명’ 하나라도 해소되지 않으면 총회 상정에 반대하십시오

- ☐ 치명 공종별 내역서·물량산출서를 엑셀 원본으로 확보했다
- ☐ 치명 설계변경 단가 적용 4단계가 계약 조문으로 확정됐다
- ☐ 치명 특화설계비가 별도 항목으로 분리되고, 표준 사양 시 공사비가 병기됐다
- ☐ 경고 물가변동 조항에 상한과 양방향 조정이 들어갔다
- ☐ 경고 ‘1식’ 항목 비율이 10% 이하이거나, 상위 10개가 분해 제출됐다
- ☐ 경고 무상 제공 항목에 감액·삭제 금지 조항이 들어갔다
- ☐ 경고 자재 대체 시 조합 사전 서면동의 조항이 들어갔다
- ☐ 경고 브랜드 확약이 확정형이고 위약·감액·해지 조항이 있다
- ☐ 경고 금융조건이 확정형이고 미이행 시 해지권이 있다

☐ **주의** 모든 시공사 제안이 **조합 통일 양식**으로 정규화됐다

☐ **주의** 검증업체를 **조합이 독자 선정**하고 조합이 대금을 지급했다

☐ **주의** 자료 제공일로부터 **21일 이상 검토기간**을 확보했다

부록 A. 용어집

용어	1줄 정의
간접공사비	공사 수행에 필요하나 건축물에 남지 않는 비용(현장운영 · 보험 · 안전).
감리	시공이 설계도서대로 이루어지는지 감독 · 확인하는 업무. 주택법상 지자체가 감리자 지정.
건설공사비지수	한국건설기술연구원 발표. 건설 자재 · 노무 · 장비 가격 변동 종합지수. 소비자물가지수보다 변동 폭이 큼.
공사비 검증제도	정비사업 공사비를 일정비율 이상 증액할 때 검증기관에 적정성 검증을 받는 제도(2019.10 시행).
관리처분계획	조합원별 분양 대상과 분담금을 확정하는 계획. 총사업비가 여기서 확정됨.
내역도급(단가도급)	항목별 단가를 확정하고 실제 물량으로 정산하는 계약 방식.
내역서	공종별 항목 · 규격 · 수량 · 단가 · 금액을 나열한 문서.
도급공사비	조합이 시공사와 도급계약으로 약정하는 금액. 시공사 책임 범위.
물가지(물가정보 · 거래가격 등)	자재 시장가격을 공표하는 공인 간행물. 단가 검증의 기준.
별도공사비	도급 범위 밖이라 조합이 따로 부담하는 공사(철거 · 지장물 · 문화재 등).
부가가치세(VAT)	10% 세금. 국민주택규모(전용 85㎡) 이하 면제, 초과분 과세.
에스컬레이션	물가변동에 따른 계약금액 조정.
연면적	각 층 바닥면적의 합계. 지하 포함 여부에 따라 값이 크게 달라짐.
원단위	면적 1㎡당 자재 소요량 등 비교용 기준값. 내역 검증의 핵심 도구.
일반관리비	본사 운영비를 현장에 배부한 금액.
일위대가	단위작업 1개(예: 콘크리트 1㎡)의 재료 · 노무 · 장비를 분해한 단가표.
적산	도면을 근거로 자재 물량과 공사비를 산출하는 일.
주민공동시설	공동주택 필수 부대복리시설. 법정 최소 기준 세대당 2.5㎡ 수준.
직접공사비	건축물에 물리적으로 투입되는 재료비 · 노무비 · 장비비.
총사업비	조합이 사업 전 기간에 지출하는 모든 비용. 분담금의 모수.
총액도급(Lump Sum)	총액을 확정하고 물량 증감 위험을 시공사가 부담하는 계약 방식.
커튼월	하중을 받지 않고 외피만 담당하는 유리 · 금속 외벽. 고급감 높으나 단가 · 유지비 높음.
특화설계	표준 설계 대비 추가되는 차별화 요소.
PF(프로젝트 파이낸싱)	사업의 미래 수익을 담보로 한 자금 조달. 정비사업은 시공사 신용보강이 일반적.
1식(一式, LS)	수량 · 단가를 분해하지 않고 묶어 계상한 표기. 검증 불가 항목.

부록 B. 실습 해설

【실습 1】 두 제안, 어느 쪽이 싼가?

A1. 대다수는 A 건설(830만원)이 싸다고 판단합니다. — 이것이 함정입니다.

A2. 정규화 계산

구분	A 건설	B 건설
면적 환산	총연면적 300,000㎡ ÷ 3.3058 = 90,750평	지상연면적 200,000㎡ ÷ 3.3058 = 60,500평
총액 산출	90,750평 × 830만원 = 약 7,532억원 (VAT 별도)	60,500평 × 1,180만원 = 약 7,139억원 (VAT 포함) → ÷ 1.1 = 약 6,490억원 (VAT 별도)

구분	A 건설	B 건설
겉보기 단가	830만원 (싸 보임)	1,180만원 (비싸 보임)
정규화 총액 (VAT 별도)	7,532억	6,490억
총연면적 기준 환산 단가	830만원	약 715만원

A3. 차액 = 7,532 – 6,490 = **약 1,042억원** → 1,000세대 기준 세대당 **약 1억 400만원**

교훈

평당 단가는 기준을 통일하기 전까지 아무 의미가 없습니다. 대의원 한 사람이 이 계산을 했느냐 안 했느냐가 세대당 1억 원을 가릅니다.

※ 실제로는 85㎡ 초과 세대 비중에 따라 실효 VAT가 4% 내외이므로 차액은 더 커집니다.

【실습 2】 요율 이상 탐지

#	문제	해설 및 조치
③	산업안전보건관리비 — 대상액 오류 치명	안전관리비의 대상액은 재료비 + 직접노무비 입니다. 도급공사비 총액 에 요율을 곱하면 간접비 · 일반관리비 · 이윤까지 대상에 포함되어 금액이 과다 산정됩니다. ▶ 대상액 산출 명세(재료비 · 직접노무비 각각의 금액) 제출 요구.
⑤	안전시설공사 — 중복 계상 의심 경고	③의 산업안전보건관리비로 이미 안전시설 · 보호구 · 안전인력 비용이 계상됩니다. ⑤가 별도로 62억 있다면 동일 항목의 이중 계상 가능성이 큼니다. ▶ ③과 ⑤의 사용 항목 대비표를 요구하여 중복 여부 확인.
⑥	일반관리비 9% — 요율 과다 경고	일반관리비는 통상 공사원가의 4~6%(5% 이내) 수준입니다. 9%는 과다합니다. ▶ “9% 적용 근거와, 귀사의 최근 3년 정비사업 현장 평균 일반관리비율을 제출해 주십시오.” ▶ 5%로 낮추면 540억 → 300억, 약 240억 절감 .

정상 항목 — ① 11%(8~13% 범위 내), ② 3.5%(2026년 건설업 산재보험료율), ④ 0.5%(0.3~0.8% 범위 내), ⑦ 10%(6~12% 범위 내)

교훈

요율 자체보다 “무엇의 몇 %인가(대상액)”가 더 중요합니다.

【실습 3】 브랜드 프리미엄 판정

A1. 3층 분해

#	항목	Layer	판정
①	외관 특화 380억	Layer 1	증빙 있음 → 검증 후 인정 가능
②	커뮤니티 확대 140억	Layer 1	증빙 불충분 (평당단가 미제출)
③	조경 고급화 90억	Layer 1	증빙 없음 (문구뿐)
④	마감재 상향 210억	Layer 1	8개 중 6개 상향 → 인정 가능
⑤	층고 상향 160억	Layer 1	증빙 있음 → 인정 가능
⑥	브랜드 적용료 109억	Layer 3	★ 원가 근거 없음

A2. 즉시 삭제 요구 — ⑥ 브랜드 적용료 109억원. 브랜드 적용료는 원가가 아니라 명목입니다. 3-2절 Layer 3 대응 스크립트를 그대로 사용하십시오. → 삭제 시 평당 120만원 → 약 108만원으로 하락.

A3. 추가 증빙 요구 2개

- ② 커뮤니티 140억 → 커뮤니티 시설별 면적표 + 3.3㎡당 공사비 단가 + 표준 사양 대비 증분
- ③ 조경 90억 → 수종 · 규격 · 수량 · 단가가 기재된 수목 수량표와 표준 사양 대비 증분표

A4. 커뮤니티 계산

- $(6 - 3.5)\text{m}^2 \times 1,000\text{세대} = 2,500\text{m}^2 = 2,500 \div 3.3058 = \text{약 } 756\text{평}$
- $756\text{평} \times 1,800\text{만원} = \text{약 } 136\text{억원}$
- 제시 금액 140억 → **검산치와 근접(차이 약 3%)** → 합리적 범위
- 단, 이는 평당 1,800만원 가정 하의 결과이므로 시공사에 **실제 적용 평당단가**를 받아 재검산해야 확정됩니다.

교훈

6개 항목 중 명확히 삭제 대상인 것은 1개(109억)입니다. 나머지는 “비싸다/싸다”의 문제가 아니라 증빙이 있느냐 없느냐의 문제입니다. 대의원은 가격을 깎는 사람이 아니라, 증빙을 받아내는 사람입니다.

【실습 5】 레드플래그 스캔

#	문구	RF	등급	핵심
1	“특화설계 포함 3.3㎡당 950만원”	RF 3	치명	특화 금액 미분리 → 검증 · 감액 불가
2	“설계변경 시 상호 협의하여 정한다”	RF 2	치명	협이는 기준이 아님 → 4단계 조문화
3	“250억 상당 무상, 변경 시 별도 협의”	RF 6 (+RF 3)	경고	‘상당’ + 단서 = 무상 아님
4	“하이엔드 브랜드 적용 적극 검토”	RF 8	경고	노력 의무 → 확정형 + 위약 조항 요구
5	“제시 사양 또는 동등 이상”	RF 7	경고	판정 주체 부재 → 사전 서면동의 요건화
6	“내역서는 본계약 후 제공”	RF 1	치명	공사비 검증 자체가 불가능
7	“이주비 무이자 3년, 이후 추후 협의”	RF 9	경고	조건부 금융 → 확정형 + 해지권
8	“차기 총회 미결정 시 조건 철회”	RF 12	주의	시간 압박 → 21일 검토기간 요구

총평

치명 등급 3개가 포함된 제안입니다. 이 상태로는 총회 상정에 반대해야 합니다.

부록 C. 총회 표결 직전 최종 10문항

대의원 각자가 아래 10개에 ‘예’라고 답할 수 있을 때만 찬성표를 던지십시오.

- ☐ 1. 나는 이 제안의 3.3㎡당 단가의 분모와 VAT 기준을 말할 수 있다.
- ☐ 2. 나는 이 제안의 정규화 총액(6단계 보정 후)을 알고 있다.
- ☐ 3. 나는 도급공사비 외에 조합이 부담할 총사업비 항목을 알고 있다.
- ☐ 4. 나는 세대당 예상 분담금과, 그것이 어떤 조건에서 늘어나는지 알고 있다.
- ☐ 5. 나는 공종별 내역서를 조합이 확보했음을 확인했다.
- ☐ 6. 나는 설계변경 시 단가 적용 방식이 계약 조문에 있음을 확인했다.
- ☐ 7. 나는 물가변동 조정의 상한이 계약에 있음을 확인했다.
- ☐ 8. 나는 특화설계비가 분리 계상되어 있고, 브랜드 적용이 확정형임을 확인했다.
- ☐ 9. 나는 금융조건을 평당 금액으로 환산한 값을 알고 있다.
- ☐ 10. 나는 이 제안의 가장 큰 리스크 3가지를 조합원에게 설명할 수 있다.

하나라도 ‘아니오’가 있다면

그것은 시공사의 문제가 아니라 우리가 아직 준비되지 않았다는 뜻입니다. 준비되지 않은 상태의 찬성표는, 조합원 전체의 재산을 근거 없이 처분하는 것과 같습니다.

표결 전 메모란

이 제안의 가장 큰 리스크 3가지 (조합원에게 설명할 수 있는 언어로)

부록 D. 참고자료

구분	자료	URL
제도 · 검증	한국부동산원 정비사업 공사비 검증 안내	reb.or.kr/reb/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=9886&cntntsId=1253
	한국부동산원 검증 신청 및 제출서류	reb.or.kr/reb/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=9887&cntntsId=1254
	정비사업 접수시스템	reb.or.kr/ccv/
	도시정비포털 — 공사비 검증 목적 및 대상	i-sh.co.kr/city/m_518/wpge/verification_purpose.do
요율 · 원가	2026년도 사업종류별 산재보험료율 (국가법령정보센터)	law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=160837293
	고용노동부 사업종류별 산재보험요율 (공공데이터포털)	data.go.kr/data/15068737/fileData.do
	조달청 공사원가계산 제비율 적용기준 (2026.01.01)	data.cmpi.or.kr/program/board/
계약 · 분쟁	물가변동에 따른 계약금액 조정 분쟁 동향과 대응 (법률신문)	lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=181472
	계약금액 조정 제도 안내 (찾기쉬운 생활법령정보)	easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?csmSeq=519&cnpClsNo=1
‘써밋’ 사례	대우건설 상도15구역 재개발 수주 (공사비 1조 4,367억)	fnnews.com/news/202607200821588139
	상도 써밋 3,207세대 조성 (한국NGO신문)	ngonews.kr/news/articleView.html?idxno=233279
	대우건설 천호동 공공재개발 써밋 적용 (한국경제)	hankyung.com/article/2026051842771
시장 동향	서울 정비사업 평당 1,500만원 시대 (더구루)	theguru.co.kr/news/article.html?no=103580
	하이엔드 브랜드 · 랜드마크 설계와 분담금 상승 (더퍼블릭)	thepublic.kr/news/articleView.html?idxno=295958
	정비사업 하이엔드 브랜드 갈등 (아주경제)	ajunews.com/view/20260629135656841

본 교재 사용에 관한 고지

본 교재의 수치는 **2026년 8월 기준 공개자료와 시장 통례를 정리한 참고치**이며, 개별 사업의 조건(층수 · 구조형식 · 지하층 수 · 대지조건 · 물가시점)에 따라 달라집니다. 실제 계약 체결 전에는 반드시 **조합이 독자 선임한 적산 · 법률 전문가의 검토**를 거쳐십시오. 본 교재는 특정 건설사의 제안에 대한 평가나 권유를 담고 있지 않습니다.
